浜松市西部清掃工場更新工事　工事だより

発行日：　2026年 10月 28日　　第 2 号


【工事概要・安全対策等】

浜松市西部清掃工場の更新事業として新工場の建設工事を実施しています。

	現工場	新工場
処理方式	キルン式ガス化溶融炉	ストーカ炉
処理能力	164.9t/日×3炉=494.7t/日	139t/日×3炉=417t/日
発電機出力	発電定格出力9,600kW	発電定格出力14,000kW

New

レーザーバリア越境検知装置を設置して安全対策を行い、場内車路へ敷き鉄板を敷設し、粉塵の飛散防止、工事車両走行ルートの制限、低振動工法の採用、ゲート付近へ騒音・振動・粉じん測定結果を公開し、環境対策を行っております。騒音・車両通行等でご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

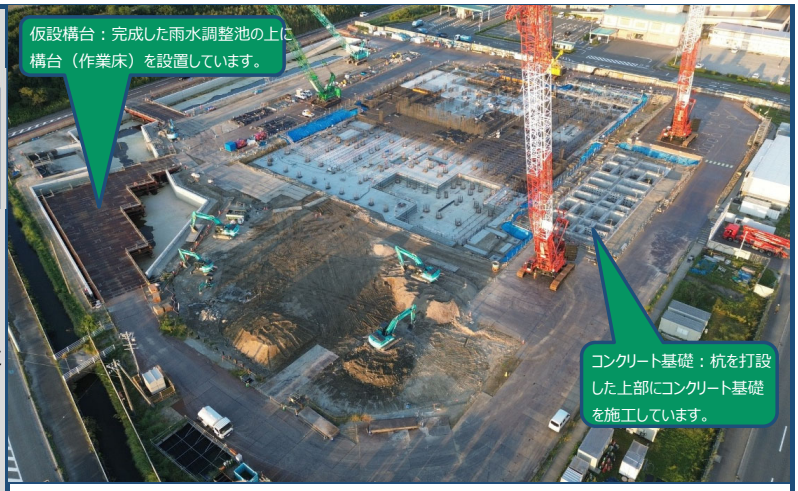

●全景写真（10月9日撮影）

【主な工事工程（予定/計画）】

工事	令和8年7月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	令和9年1月	2 月
造成工事	雨水調整池工事							
				鋼矢板撤去				
建築工事		工場棟基礎工事						
					工場棟1階鉄骨・コンクリート工事			
						工場棟2階鉄骨・コンクリート工事		
プラント工事						工場棟1階プラント機器据付工事		

▲現在

【工事進捗（写真）】



●工場棟基礎　コンクリート打設作業



●工場棟1階　鉄骨建て方作業

TOPIC

〖熱中症対策ウォッチ〗

今年の浜松市では、最高気温35度以上の日が7月は11日間、8月は4日間ありました。本現場では、熱中症対策ウォッチを導入して、暑熱リスクを判断し、色・音・振動で事前に作業者に伝えることを行っています。これにより、作業員の熱中症の低減を図っています。



【連絡先】
施工者：JFEエンジニアリング株式会社
現場代理人：押井 博也
電話：080-8720-1307
（受付：平日 9:00～17:00）
※お気づきの点がございましたらご連絡ください。
